


## 2207.07 GS Haubenschloßschule

Erweiterung und Sanierung




## 2207.07 GS Haubenschloßschule

Luftbild

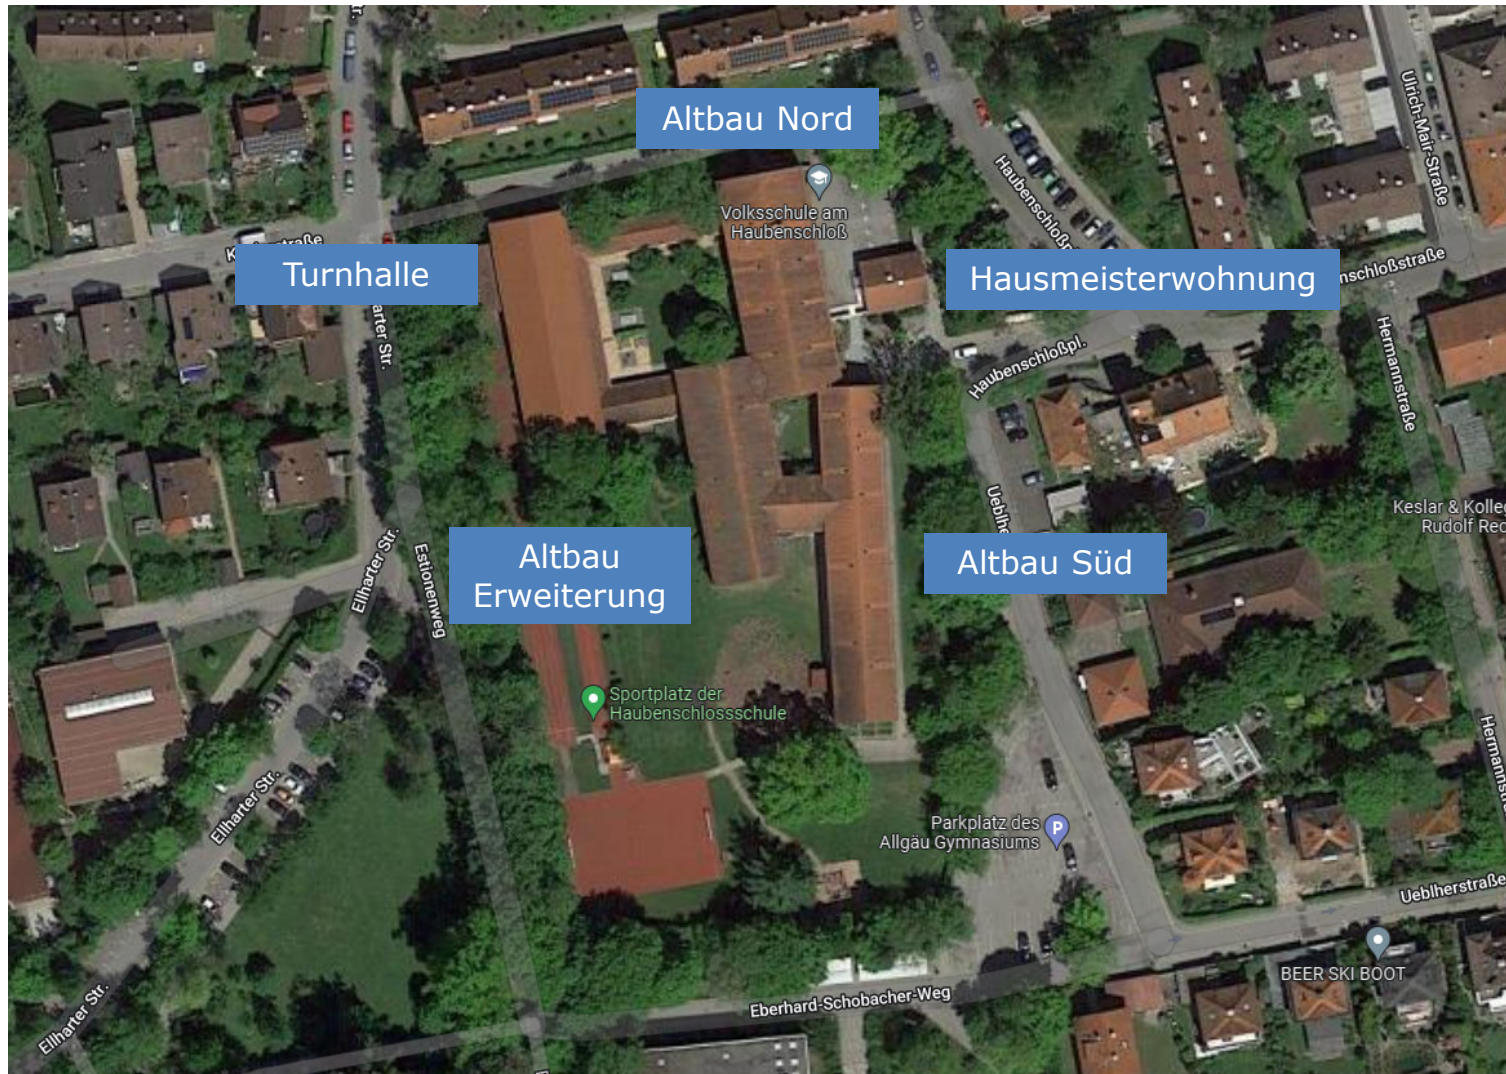

## 2207.07 GS Haubenschloßschule

### Bauabschnitte

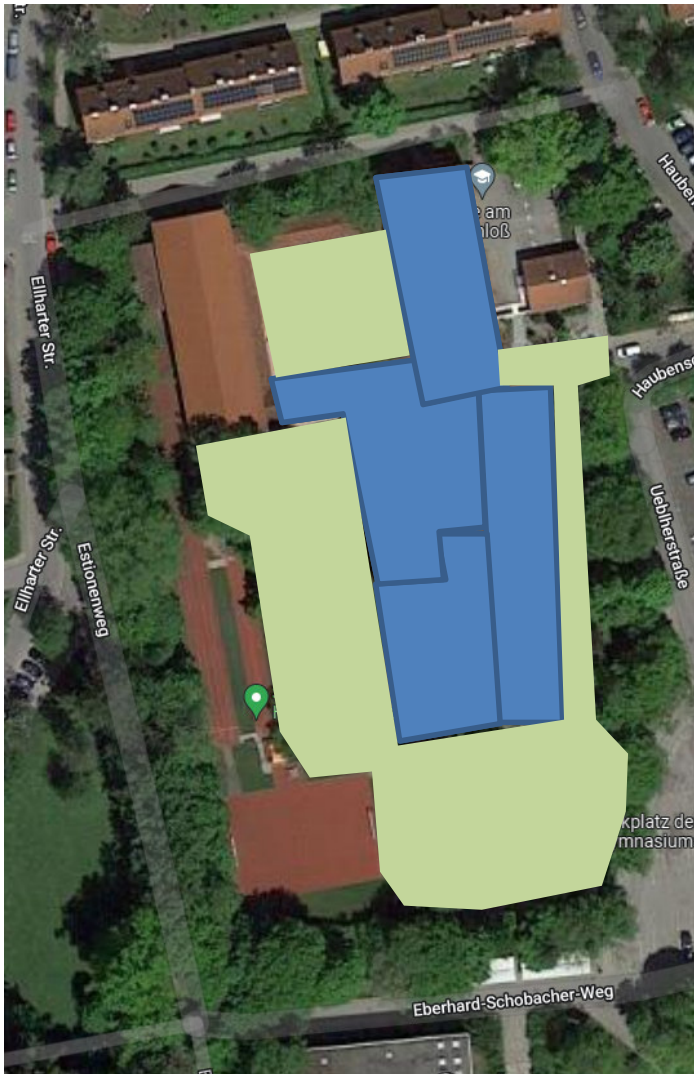

| Gebäudeteil                       | Fertigstellung |
|-----------------------------------|----------------|
| BA 1 Sanierung Altbau Nord        | 09-2014        |
| Raummodul 19. Klassenzimmer       | 03-2023        |
| BA 4 Neubau Erweiterung           | 06-2023        |
| BA 3 Sanierung Altbau Erweiterung | 05-2024        |
| BA 2 Sanierung Altbau Süd         | 03-2025        |
| Außenanlagen                      | 09-2025        |


## 2207.07 GS Haubenschloßschule

### Kosten

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| IP 2020                   | 10.184.000 € |
| IP 2023                   | 11.393.500 € |
| 2023 vertraglich gebunden | 10.075.438 € |


# 2207.07 GS Haubenschloßschule

## Grundriss EG

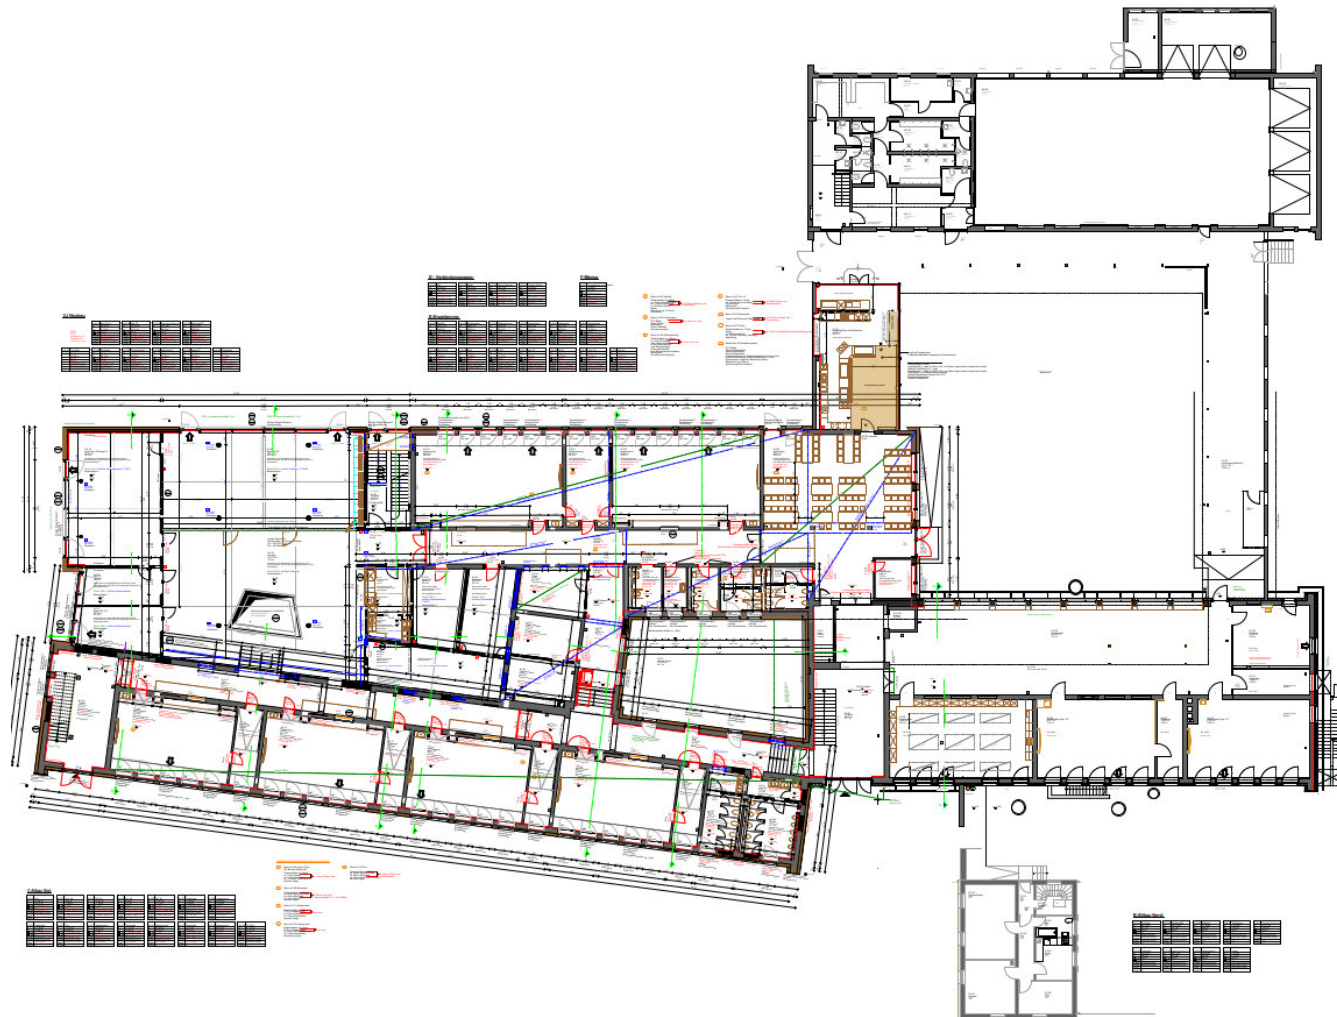

# 2207.07 GS Haubenschloßschule

Grundriss OG

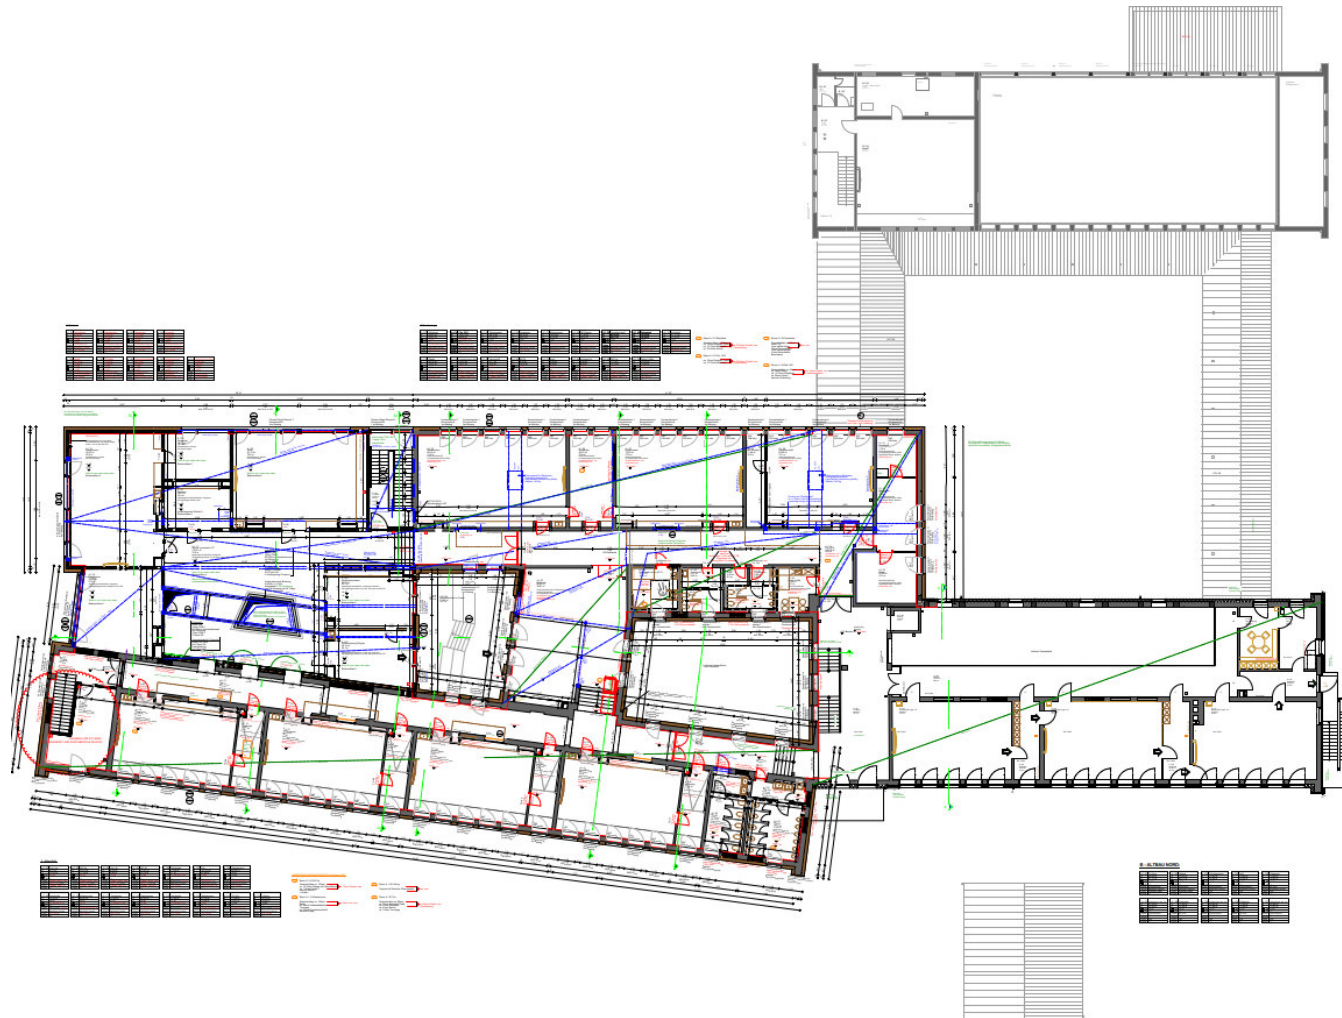

## 2207.07 GS Haubenschloßschule

### Baustellenfotos



## 2207.07 GS Haubenschloßschule

### Baustellenfotos

